Projektplan - Website für Papa und Ich (https://www.papaundich.at)

Laufzeit: 01.10.2026 – 26.02.2027

Projektauftraggeber: Florian Piribauer (Obmann von „Papa Und Ich“)

Projektauftragnehmer: Philip Staudacher

Matrikelnummer: 12304362

Revision	Datum	Änderung
1.0	26.09.2026	Aufsetzen der groben Dateistruktur, inklusive Inhalten
1.1	20.10.2026	Ergänzung der Arbeitspakete und Personas
1.2	07.11.2026	Hinzufügen der Risikoanalyse und der Anforderungsanalyse
1.3	09.11.2026	Ergänzung in Risikoanalyse, Festlegung der Systemanforderungen
1.4	12.11.2026	Fehlerkorrektur, Ergänzung einzelner Bereiche

Inhalt

Projektplan - Website für Papa und Ich 1
Ausgangslage 3
Ziele und Nicht-Ziele 3
Personas 4
Konkrete Fragestellung 4
Erfolgskriterien 5
Systemvoraussetzungen 5
Projektstruktur 5
Ressourcen 6
Arbeitspakete 7
    Meilensteine 10
    GANTT-Chart 11
Anforderungsbeschreibung 11
  Funktionale Anforderungen 11
  Nichtfunktionale Anforderungen 11
  Technische Anforderungen 12
Projektrisiken und Mitigation 12

Ausgangslage

„Papa und Ich“ ist ein in Linz ansässiger Verein, der es sich zum Auftrag macht, Ausflüge für Väter und deren Kinder zu planen. Zurzeit wird die ganze Kommunikation über WhatsApp betrieben, wodurch bei der nun gestiegenen Mitgliederzahl (ca. 25 aktive Mitglieder) oftmals die Übersicht verloren geht. Eine Website existiert schon, aber nur mit einfachen Informationen, um Neuinteressierten den Verein grob vorzustellen.

Ziele und Nicht-Ziele

Ziele	Nicht-Ziele
Für die Obmänner	
• Organisationsaufwand durch zentralen internen Bereich verringern • Fotos und Videos vor Veröffentlichung freigeben • Newsletter und Mahnungen mit wenigen Klicks verschicken • Dateien in integrierten Speicher ablegen können • Diskussionen geordneter führen können	• Keine Online-Zahlungsabwicklung (Nur Erinnerungen) • Keine Buchhaltung • Keine Rechtsberatung • Keine Wartung nach Projektende (Übergabe mit Kurzanleitung)
Für die Mitglieder	
• Einfache Anmeldung zu Ausflügen • Alle wichtigen Informationen schnell sehen können • Leichteres Kommunizieren und Vernetzen untereinander	• Kein vollständiger Ersatz für die WhatsApp-Gruppe • Keine öffentliche Registrierung (Wird durch Admins durchgeführt)
Allgemein	
• Gestaltung vorrangig für mobile Geräte (dennoch benutzbar auf Desktop) • Überarbeitete öffentliche Website	• Keine klassische App im App-Store • Kein kompletter Neubau der Startseite

Personas

	Christian	Roman
Rolle	Obmann	Mitglied
Alter	30	40
Familie	2 Kinder	3 Kinder
Technisches Verständnis	Durchschnittlich	Unterdurchschnittlich
Hauptgerät	Handy	Handy
Ziele	Organisation zentral und einfach steuern -> Die Informationen unmissverständlich weitergeben	Schnelle Infos über den nächsten Ausflug und andere Zuständigkeiten auf einen Blick
Probleme	• Wenig Zeit • Wenig Wissen über DSGVO und fühlt sich nicht zuständig	• Wenig Zeit • Liest gestresst und unaufmerksam • Verliert Sehkraft (trägt dennoch keine Brille)
Bedürfnisse	Einträge einfach und schnell erstellen können	Wichtige Infos auf einen Blick mit großer lesbarer Schrift
Folgen für das Design	Wenige, aber klare Schritte für Admin-Aufgaben, Vorschau vor Veröffentlichung, Datenschutz auch im System verankern	Die wichtigsten Infos direkt nach Login in einer Schrift von min. 16px, hoher Kontrast, große Tippflächen, kurze Texte

Konkrete Fragestellung

Wie muss ein mobiler Mitgliederbereich gestaltet sein, damit Admins ihre Tätigkeiten selbstständig und mit so wenig Klicks wie möglich verwalten und die Väter Informationen möglichst leicht und auf einen Blick erreichen können?

Erfolgskriterien

Das Projekt gilt als erfolgreich, wenn bei den Think-Aloud-Tests folgende Punkte erfüllt sind:

- Die Personen können die Aufgaben **selbstständig** lösen
- Die Admin-Aufgaben gelingen in höchstens **3 Schritten**
- Mitglieder finden Datum und Treffpunkt innerhalb von **15 Sekunden**
- Die Obmänner geben die Website vor der Veröffentlichung frei

Systemvoraussetzungen

Die Website läuft auf dem bestehenden **Webhosting-Server** des Vereins mit WordPress. Vorausgesetzt sind die für WordPress empfohlenen Versionen von **PHP und MySQL**. Außerdem wird für den Versand von E-Mails ein **SMTP-Zugang** benötigt.

Die **Entwicklung** läuft auf einer lokalen Kopie, versioniert mit Git und GitHub.

Der Mitgliederbereich wird für alle **Smartphones** und **mobile Browser** optimiert. Die Nutzung am Desktop ist auch möglich.

Projektstruktur



Ressourcen

Personalaufwand
Philip Staudacher
Projektbudget
300 Arbeitsstunden (AS) (12 ECTS)
Sonstige Aufwände und nötige Kenntnisse
• WordPress-Zugang des Vereins • Sicherer Umgang mit den Programmiersprachen (PHP, HTML, CSS, JS) • Usability Tests • 4 Testpersonen (2 Obmänner, 2 Mitglieder)

Arbeitspakete

AP 1	Projektmanagement (60 AS)	01.10.2026 – 26.02.2027
ZIEL		
• Durch dieses Arbeitspaket soll die Struktur des Projekts erhoben und ein Zeitplan erstellt sowie eingehalten werden. • Durch monatliche Update-Meetings werden die Obmänner auf dem aktuellen Stand gehalten und können weitere Inputs zum Projekt geben		
INHALT | AUFGABEN		
Task 1.1: Projektstart (25 AS) 01.10.2026 bis 13.11.2026 • Klärung der Projektgrundlagen • Erstellen des GitHub-Projekts • Erstellung der Designspezifikation • Erstellung des Projektplans Task 1.2: Regelmäßige Kundenupdates (15 AS) 01.10.2026 – 26.02.2027 • Monatliche Meetings mit den Obmännern, um den Projektstand zu besprechen • Bei akuten Updates und Fragen werden diese über eine eigene WhatsApp-Gruppe geklärt Task 1.3: Projektabschluss (20 AS) 14.01.2027-26.02.2027 • Abhalten des Abschlusspitches • Abgabe des Endberichts		
MEILENSTEINE | DELIVERABLES		
M1.1 Fertigstellung der Designspezifikation -> 06.11.2026 M1.2 Fertigstellung des Projektplans -> 13.11.2026 M1.3 Fertigstellung des Projektes -> 26.02.2027 D1.1: Designspezifikation -> 06.11.2026 D1.2: Projektplan -> 13.11.2026 D1.3: Abschlusspitch -> 27.01.2027 D1.4: Endbericht -> 26.02.2027		

AP 2	Bestandsaufnahme (50 AS)	01.10.2026 – 31.10.2026

ZIEL

- Das bestehende System soll kennengelernt und verstanden werden
- Anforderungen und Wünsche sollen verstanden werden
- Die verschiedenen Personas entstehen auf Basis der Erstgespräche

INHALT | AUFGABEN

Task 2.1 Website-Analyse und initiale Problembehebung (20 AS) 01.10.2026 – 14.10.2026

- Begutachten der ursprünglichen Website sowie Notieren der Auffälligkeiten
- Vertrautmachen mit dem ursprünglichen System der Website
- Behebung der akut auftretenden Probleme (nicht funktionierende Plugins etc.)

Task 2.2 Interviews und Fragebogen (15 AS) 15.10.2026 – 22.10.2026

- Erstgespräche mit den Obmännern und einigen Mitgliedern, um Anforderungen zu erfahren und Prioritäten zu setzen
- Erstellung eines Fragebogens sowie Ausgabe bei der Mitgliederversammlung

Task 2.3 Personas und Anforderungen (15 AS) 23.10.2026 – 31.10.2026

- Auf Basis der Ergebnisse von Task 2.2 werden Personas und verschiedene Anforderungen erstellt

MEILENSTEINE | DELIVERABLES

M2.1: Abgeschlossene Interviews, inklusive Prioritätenliste -> 22.10.2026
M2.2: Fertiggestellte Fragebögen inklusive deren Auswertung -> 31.10.2026

D2.1: Anforderungsanalyse -> 31.10.2026

AP 3	Konzeption und Umsetzung (110 AS)	01.11.2026 – 21.12.2026

ZIEL

- Auf Basis von AP 2 soll eine fertige Website erstellt werden. Diese soll einen leicht zu bedienenden internen Bereich und einen verschönerten öffentlichen Bereich beinhalten.
- Die verschiedenen Funktionen sollen je nach erarbeiteter Priorität abgearbeitet werden.
- Ein Datenschutzkonzept wird erstellt und mit den Obmännern besprochen

INHALT | AUFGABEN

Task 3.1: Datenschutz-Elemente (10 AS) 01.11.2026 – 21.11.2026

- Erarbeitung des Datenschutzkonzepts sowie Aufklärung der Obmänner

Task 3.2: Umsetzung interner Bereich (80 AS) 01.11.2026 – 10.12.2026

- Priorität 1: Login für Mitglieder und Admins (Obmänner)
- Priorität 1: Leicht zu bearbeitender Eventkalender
- Priorität 1: Upload-Möglichkeit für Bestätigungen sowie Verweis zur ID-Austria PDF-Signatur
- Priorität 2: Integrierter Newsletter und Mahnmailverteiler für Admins
- Priorität 2: Fotobereich für alle (Bestätigungsfunktion der Admins)
- Priorität 3: Integrierter Speicher für Admins
- Priorität 3: Chatsystem für jeweilige Events

Task 3.3: Umsetzung Startseite (20 AS) 11.12.2026 – 21.12.2026

- Neugestaltung der öffentlichen Website

MEILENSTEINE | DELIVERABLES

M3.1: Fertigstellung der Programmieraufgaben -> 21.12.2026


D3.1: Fertige Offline-Version der internen und öffentlichen Seite -> 21.12.2026
D3.2: Datenschutzkonzept -> 21.11.2026

AP 4	Tests und Überarbeitung (80 AS)	22.12.2026 – 31.01.2027
ZIEL		
• Die noch nicht veröffentlichte Website wird getestet • Auf Basis des Feedbacks wird die Website weiter überarbeitet und veröffentlicht.		
INHALT | AUFGABEN		
Task 4.1: Testvorbereitung (10 AS) 22.12.2026 – 31.12.2026 • Festlegen der Testumgebung, inklusive der verschiedenen Tasks Task 4.2: Think-Aloud-Tests (20 AS) 01.01.2027 – 10.01.2027 • Durchführen der Think-Aloud-Tests mit den 2 Obmännern und 2 Mitgliedern Task 4.3: Auswertung (20 AS) 11.01.2027 – 18.01.2027 • Erstellen der neuen Anforderungen • Notieren der verschiedenen Problemstellen Task 4.4: Überarbeitung und Veröffentlichung (30 AS) 19.01.2027 – 31.01.2027 • Verbesserung der Website auf Basis des Feedbacks von Task 4.3 • Veröffentlichung der Website nach Absprache mit Obmännern		
MEILENSTEINE | DELIVERABLES		
M4.1: Tests abgeschlossen und ausgewertet -> 18.01.2027 M4.2: Website veröffentlicht -> 31.01.2027 D4.1: Fertig getestete Website bereit zur Veröffentlichung -> 31.01.2027		

Meilensteine

Meilenstein	Name	Fertigstellung
M1.1	Fertigstellung der Designspezifikation	06.11.2026
M1.2	Fertigstellung des Projektplans	13.11.2026
M1.3	Fertigstellung des Projektes	26.02.2027
M2.1	Abgeschlossene Interviews, inklusive Prioritätenliste	22.10.2026
M2.2	Fertiggestellte Fragebögen inklusive deren Auswertung	31.10.2026
M3.1	Fertigstellung der Programmieraufgaben	21.12.2026
M4.1	Tests abgeschlossen und ausgewertet	18.01.2027
M4.2	Website veröffentlicht	31.01.2027

GANTT-Chart

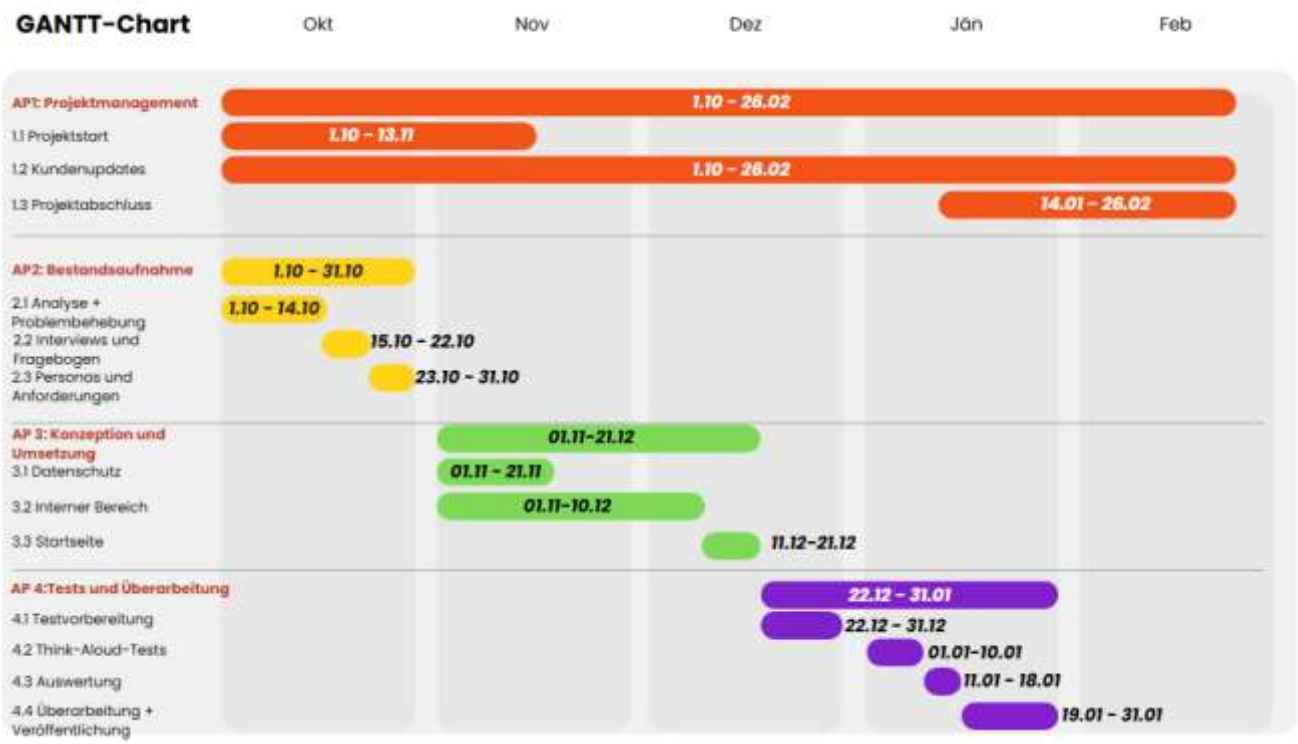

Anforderungsbeschreibung

Funktionale Anforderungen

- Mitglieder und Admins können sich anmelden und sehen nur die für sie vorgesehenen Bereiche
- Admins legen Ausflüge mit Datum, Ort, Treffpunkt und Beschreibung im Eventkalender an und bearbeiten sie
- Mitglieder können diese Ausflüge im Kalender sehen und sich anmelden
- Mitglieder laden Fotos zu einem Ausflug hoch. Diese werden erst nach Freigabe durch einen Admin sichtbar.
- Admins können Einverständniserklärungen hochladen, die Mitglieder herunterladen und mit ID-Austria signieren und anschließend zurückschicken
- Admins können Nachrichten und Erinnerungen an alle oder bestimmte Gruppen der Mitglieder senden
- (optional) Zu den Ausflügen gibt es die Möglichkeit zum Austausch per Chat

Nichtfunktionale Anforderungen

Bedienbarkeit: Die Aufgaben sind ohne Hilfe und mit wenigen Schritten erreichbar. Die wichtigsten Informationen (Ausflüge etc.) sind direkt nach dem Login sichtbar.

Barrierefreiheit: Nach WCAG 2.2: Fließtexte mindestens 16px, Tippflächen mindestens 48x48px, genügend Kontrast.

Mobile First: Die gesamten Funktionen sind am Smartphone vollumfänglich nutzbar.

Datenschutz: Fotos sind nur für befugte, eingeloggte Mitglieder sichtbar. Die Verarbeitung erfolgt nach DSGVO. Daten können gelöscht werden.

Sicherheit: Übertragung nur über HTTPS. Berechtigungen werden bei jeder Aktion serverseitig geprüft.

Wartbarkeit: Möglichst wenige zu pflegende Plugins bzw. Kurzanleitung für Obmänner für die notwendigen Vorgänge

Technische Anforderungen

- Umsetzung auf bestehender WordPress-Seite.
- Eigene Plugins (PHP) für Foto-Freigaben, Verteiler und Admin-Formulare.
- Login und Rollen über bestehende WordPress-Plugins, optisch angepasst mit CSS
- E-Mail-Versand mit SMTP-Plugin
- Child-Theme (HTML, CSS) für das neue Design und die mobile Ansicht, damit Updates des bestehenden Themes nichts überschreiben
- JavaScript für Aktionen ohne Neuladen der Seite

Projektrisiken und Mitigation

H = hoch, M = mittel, N = niedrig.

	Risiko	Bewältigungsstrategie	Art	Aktualisierung
1	Verkalkulieren im Zeitplan	Prioritäten setzen für etwaige Kürzungen, um die Abgabefrist einzuhalten und genug Puffer einbauen	H	07.11.2026
2	Testpersonen über die Feiertage nicht verfügbar	Terminfindung bis Mitte Dezember	H	07.11.2026
3	Datenverlust bzw. Verlust von Arbeitsfortschritt	Lokale Speicherung der Fortschritte und regelmäßige Github-Commits	M	07.11.2026
4	Ausfall durch Krankheit	Genug Puffer im Zeitplan	N	07.11.2026
5	Konflikte durch Plugins	Nur wenige Plugins wählen, vorhandene hinterfragen und lokal testen	M	09.11.2026
6	Datenschutzverstoß speziell bei Kinderfotos	Fotos nur für Mitglieder und Freigabe durch Admins, Datenschutzkonzept	H	09.11.2026
